



東広島高田道路 安全協議会だより



東広島高田道路建設工事現場より

新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

いつも地域の皆様にはご理解とご協力を賜わり、誠にありがとうございます。

さて、現在進行中の工事につきまして、以下の通り進捗状況をご報告いたします。

もうご覧になられた方も多いでしょうが、入口に信号機や標識が設置されており、まもなく全体が完成します。5月25日(日)には、午後4時ごろからいよいよ供用開始となります。

何かご不明点やご意見がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。工事に関するお問い合わせ先は、右上の通りでございます。

暑い季節に向かいますが、くれぐれも健康に気を付けてお過ごしください。

引き続きご理解とご協力をお願い申し上げますと共に、益々のご発展をお祈り申し上げます。



「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者		令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	4月末現在 進捗率
吉田工区①	国道54号 交差点改良	高田舗道(有)	予定								78.0%
			実施								75.5%
全工区①	安全施設設置	宮川興業(株)	予定								100.0%
			実施								100.0%
全工区②	標識設置	(株)東伸	予定								98.0%
			実施								98.0%
全工区③	道路改良 舗装	富田組(株)	予定								23.0%
			実施								23.0%
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定								100.0%
			実施								100.0%
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定								100.0%
			実施								100.0%
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定								100.0%
			実施								100.0%
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテックー心	予定								100.0%
			実施								100.0%
正力工区	トンネル内電波基地局	(株)きんでん	予定								97.0%
			実施								97.0%

各工区の進捗状況につきましては
裏面をご覧ください。

作成代表者



〒731-0501

広島県安芸高田市吉田町吉田3266-1

高田舗道 有限会社

0826-42-2027

<https://takatahodou.com>

工事に関する
問い合わせ先



広島県北部建設事務所 工務第二課

電話:0824-63-5181(担当:箕・石原)

広島県 土木建築局 営繕課

電話:082-513-4198(担当:磯道・平岡・永井)

進捗状況


吉田側坑口より



正力側坑口より



主に坑内機器取付・ケーブル
敷設・接続、区画線設置、
54号線を施工中です。

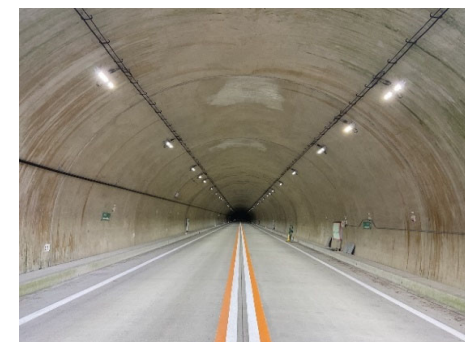

坑内の状況

裏面へ続く

東広島高田道路に於ける進捗状況(2025年4月末現在)

正力工区全体



吉田工区①

担当業者: 高田舗道(有)



国道54号線と
東広島高田道路の
交差点改良工事

正力工区

担当業者: (株)きんでん



トンネル電波基地局

トンネル工区①

担当業者: 塩田工業(株)



工事完了です

非常用設備
(消火栓等)
の工事



トンネル工区②

担当業者: (株)日立インダストリアル
プロダクツ 中国営業所



工事完了です

換気設備
の工事



トンネル工区③

担当業者: 大亜工業(株)



工事完了です

電気設備
(トンネル照明等)
の工事



トンネル工区④

担当業者: (株)メディアテックー心



工事完了です

警報表示板・
非常電話設置等
の工事



全体図



全工区② 現道部施工有り

全工区①

担当業者: 宮川興業(株)




安全施設設置



全工区②

担当業者: (株)東伸



標識設置



全工区③

担当業者: 富田組(株)



道路改良
舗装



トンネル工区④

担当業者: (株)メディアテックー心

